

โครงสร้างทีม & Operating Model

ทีม 9 คน · ERP · Transformation · งานพันธกิจหลัก

เอกสารสื่อสารภายในทีม — 2026

? โจทย์ที่เราเจอ

- ทีมมีเพียง **9 คน** แต่ต้องทำ **3 ภารกิจพร้อมกัน**
 - ● วางรากฐานระบบ **ERP** (โครงการพิเศษ เร่งด่วน)
 - ● **Transform** กระบวนการ — พัฒนาระบบใหม่หลายระบบ
 - ● **งานพันธกิจหลัก (BAU)** ของศูนย์
- ⚠ ปัจจุบัน: ทีมถูกดึงไปทำโครงการ **จนไม่มีเวลาทำงานหลัก**
- 🕒 มี **deadline ชัดเจน** กดดันด้านเวลา

ทางออก: คัดเลือก 2 ตัว

คัดเลือก	ความหมาย
ERP เป็น off-the-shelf	ทีมในไม่ต้อง build เอง → เปลี่ยนเป็น "ผู้คุม"
มีงบจ้างภายนอก	ใช้ vendor/SI รับภาระงาน build หนัก

➡ ทีม 9 คนทำหน้าที่ requirement · integration · UAT · sign-off แทนการลงมือ build ทุกอย่างเอง

หลักคิด 4 ข้อ


1. แยก "Run" ออกจาก "Change" — กันคนปกป้องงานหลัก
2. ทีมในเป็นผู้คุม ไม่ใช่ผู้ลงมือทั้งหมด — vendor build, เรา sign-off
3. มีเจ้าของชัดเจน — ทุกงานมีผู้รับผิดชอบสุดท้าย (A) คนเดียว
4. ลด Single Point of Failure — โดยเฉพาะ DBA & Reporter



ผังโครงสร้างทีม

โครงสร้างทีมส่งมอบ & Operating Model — ทีม 9 คน

ERP (off-the-shelf) · Transformation/ระบบใหม่ · งานพันธกิจหลัก (BAU)

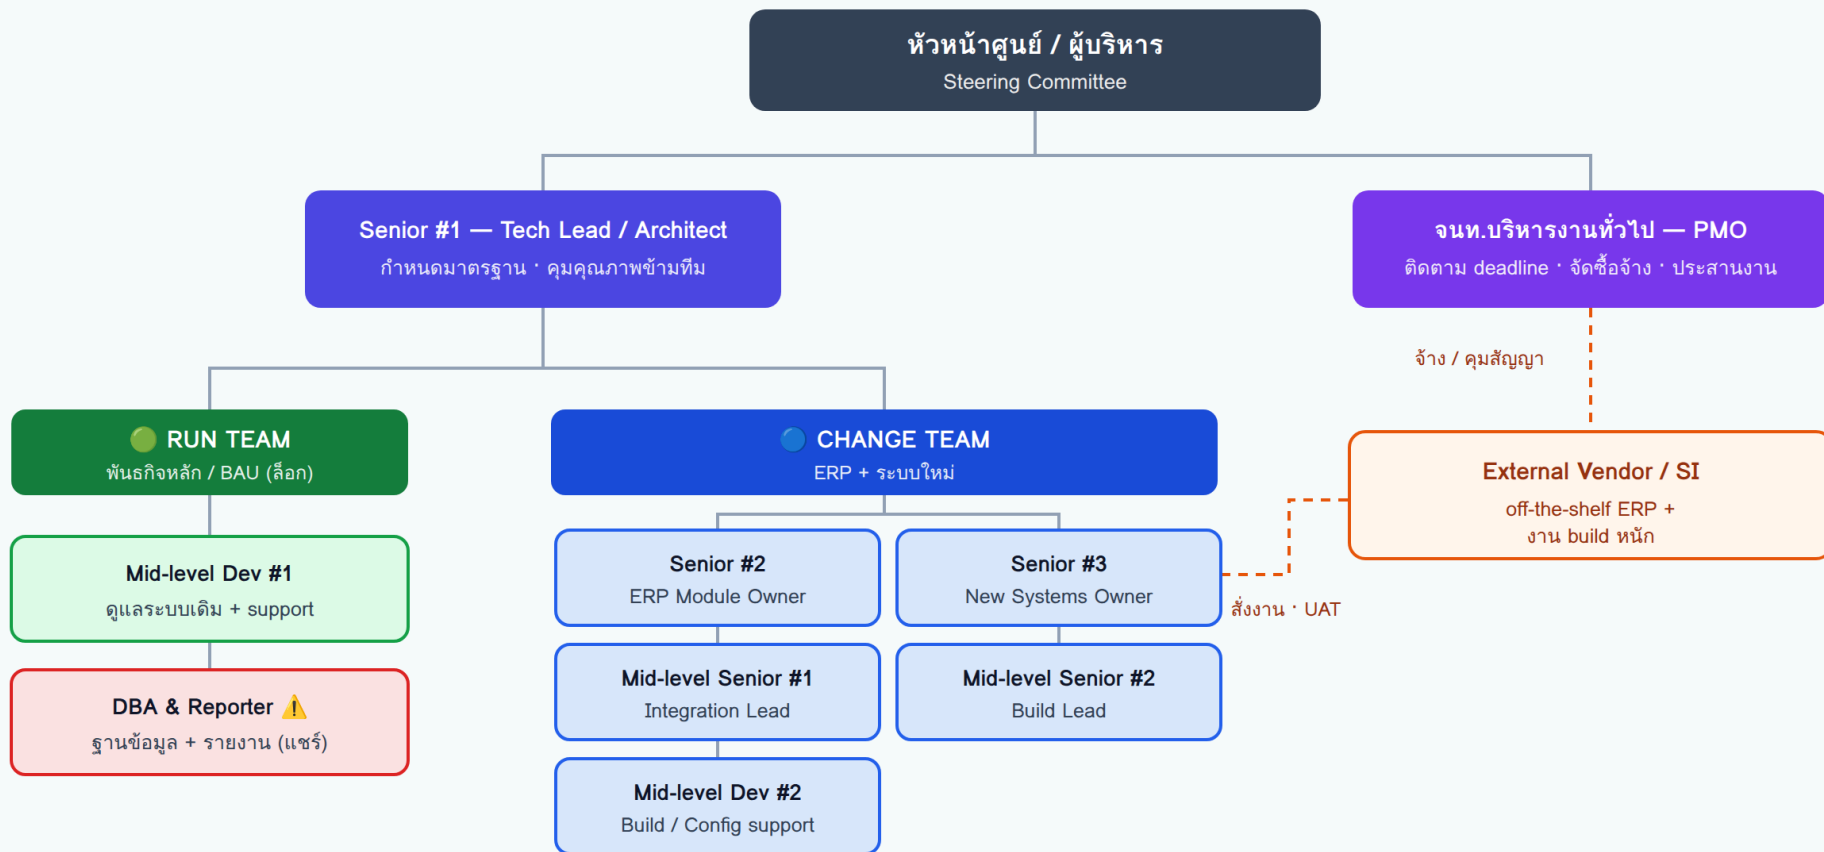

— งานพันธกิจหลัก (ถูกล็อก ห้ามดึงไปโครงการ)

Change Team — ERP + ระบบใหม่

ulted · I=Informed | เส้นประสีส้ม = ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก

Vendor ลงมือ build (R) · คนในเลือกความรับผิดชอบ (A) ไม่ lock-in

⚠️ DBA & Reporter = SPOF → ต้องทำ KT + มี vendor สำรอง

ใครอยู่ตรงไหน

บทบาท	คน	สังกัด
Tech Lead / Architect	Senior #1	ข้ามทีม
ERP Module Owner	Senior #2	● Change
New Systems Owner	Senior #3	● Change
Integration Lead	Mid-Snr #1	● Change
Build Lead	Mid-Snr #2	● Change
Build / Config support	Mid Dev #2	● Change
Run Developer	Mid Dev #1	● Run
DBA & Reporter ⚠	DBA #1	●/● แฮร์รี่
PMO / Vendor & Procurement	จนท.บริหารฯ	Enablement



RACI (ย่อ) — ใครรับผิดชอบอะไร

ระบบ / งาน	เจ้าของ (A)	ลงมือ (R)
พันธกิจหลัก / BAU	Run Dev	Run Dev
ERP — implement	ERP Owner	Vendor
ระบบใหม่ (build เอง)	New Sys Owner	Build Lead
Integration	Tech Lead	Integration Lead
Data / Reporting	DBA & Reporter	DBA & Reporter
Vendor & จัดซื้อจ้าง	PMO	PMO

ERP: Vendor ลงมือ (R) · ERP Owner รับผิดชอบ (A) → กั้น lock-in

วิธีทำงาน

- **Run Team** — ล็อกเวลา ~40–50% กับ BAU ห้ามดึงไปโครงการ
- **Change Team** — **Scrum** sprint 2 สัปดาห์ มี demo
- งาน support — **Kanban + SLA**
- **Vendor-led:** vendor build → เรา UAT → integration → sign-off
- ประชุม: Daily standup · Weekly sync · Biweekly steering

ความเสี่ยง & การรับมือ

ความเสี่ยง	วิธีลด
DBA คนเดียว (SPOF)	KT + vendor สำรอง + runbook
Deadline เร่ง + คนน้อย	ตัด scope เป็น phase, vendor รับงานหนัก
BAU ถูกละเอียดช้า	ลือก Run Team + governance
พึ่ง vendor เกินไป	ทีมในถื่อ architecture + บังคับ KT



Quick Wins — 3 เดือนแรก

- เดือน 1: ล็อก Run Team + จ้าง vendor งานเร่งด่วน → ปลดภาระทันที
- เดือน 1-2: กำหนด MVP scope ERP + เริ่ม KT งาน DBA
- เดือน 2-3: ตั้ง PMO เบา ๆ + dashboard ติดตาม deadline

ขับเคลื่อนพร้อมกัน

ปกป้องงานหลัก ● · เร่งโครงการ ● · ใช้ vendor ให้คุ้ม ●

รายละเอียดเต็ม: เอกสาร "12 - โครงสร้างทีมและ Operating Model"
